


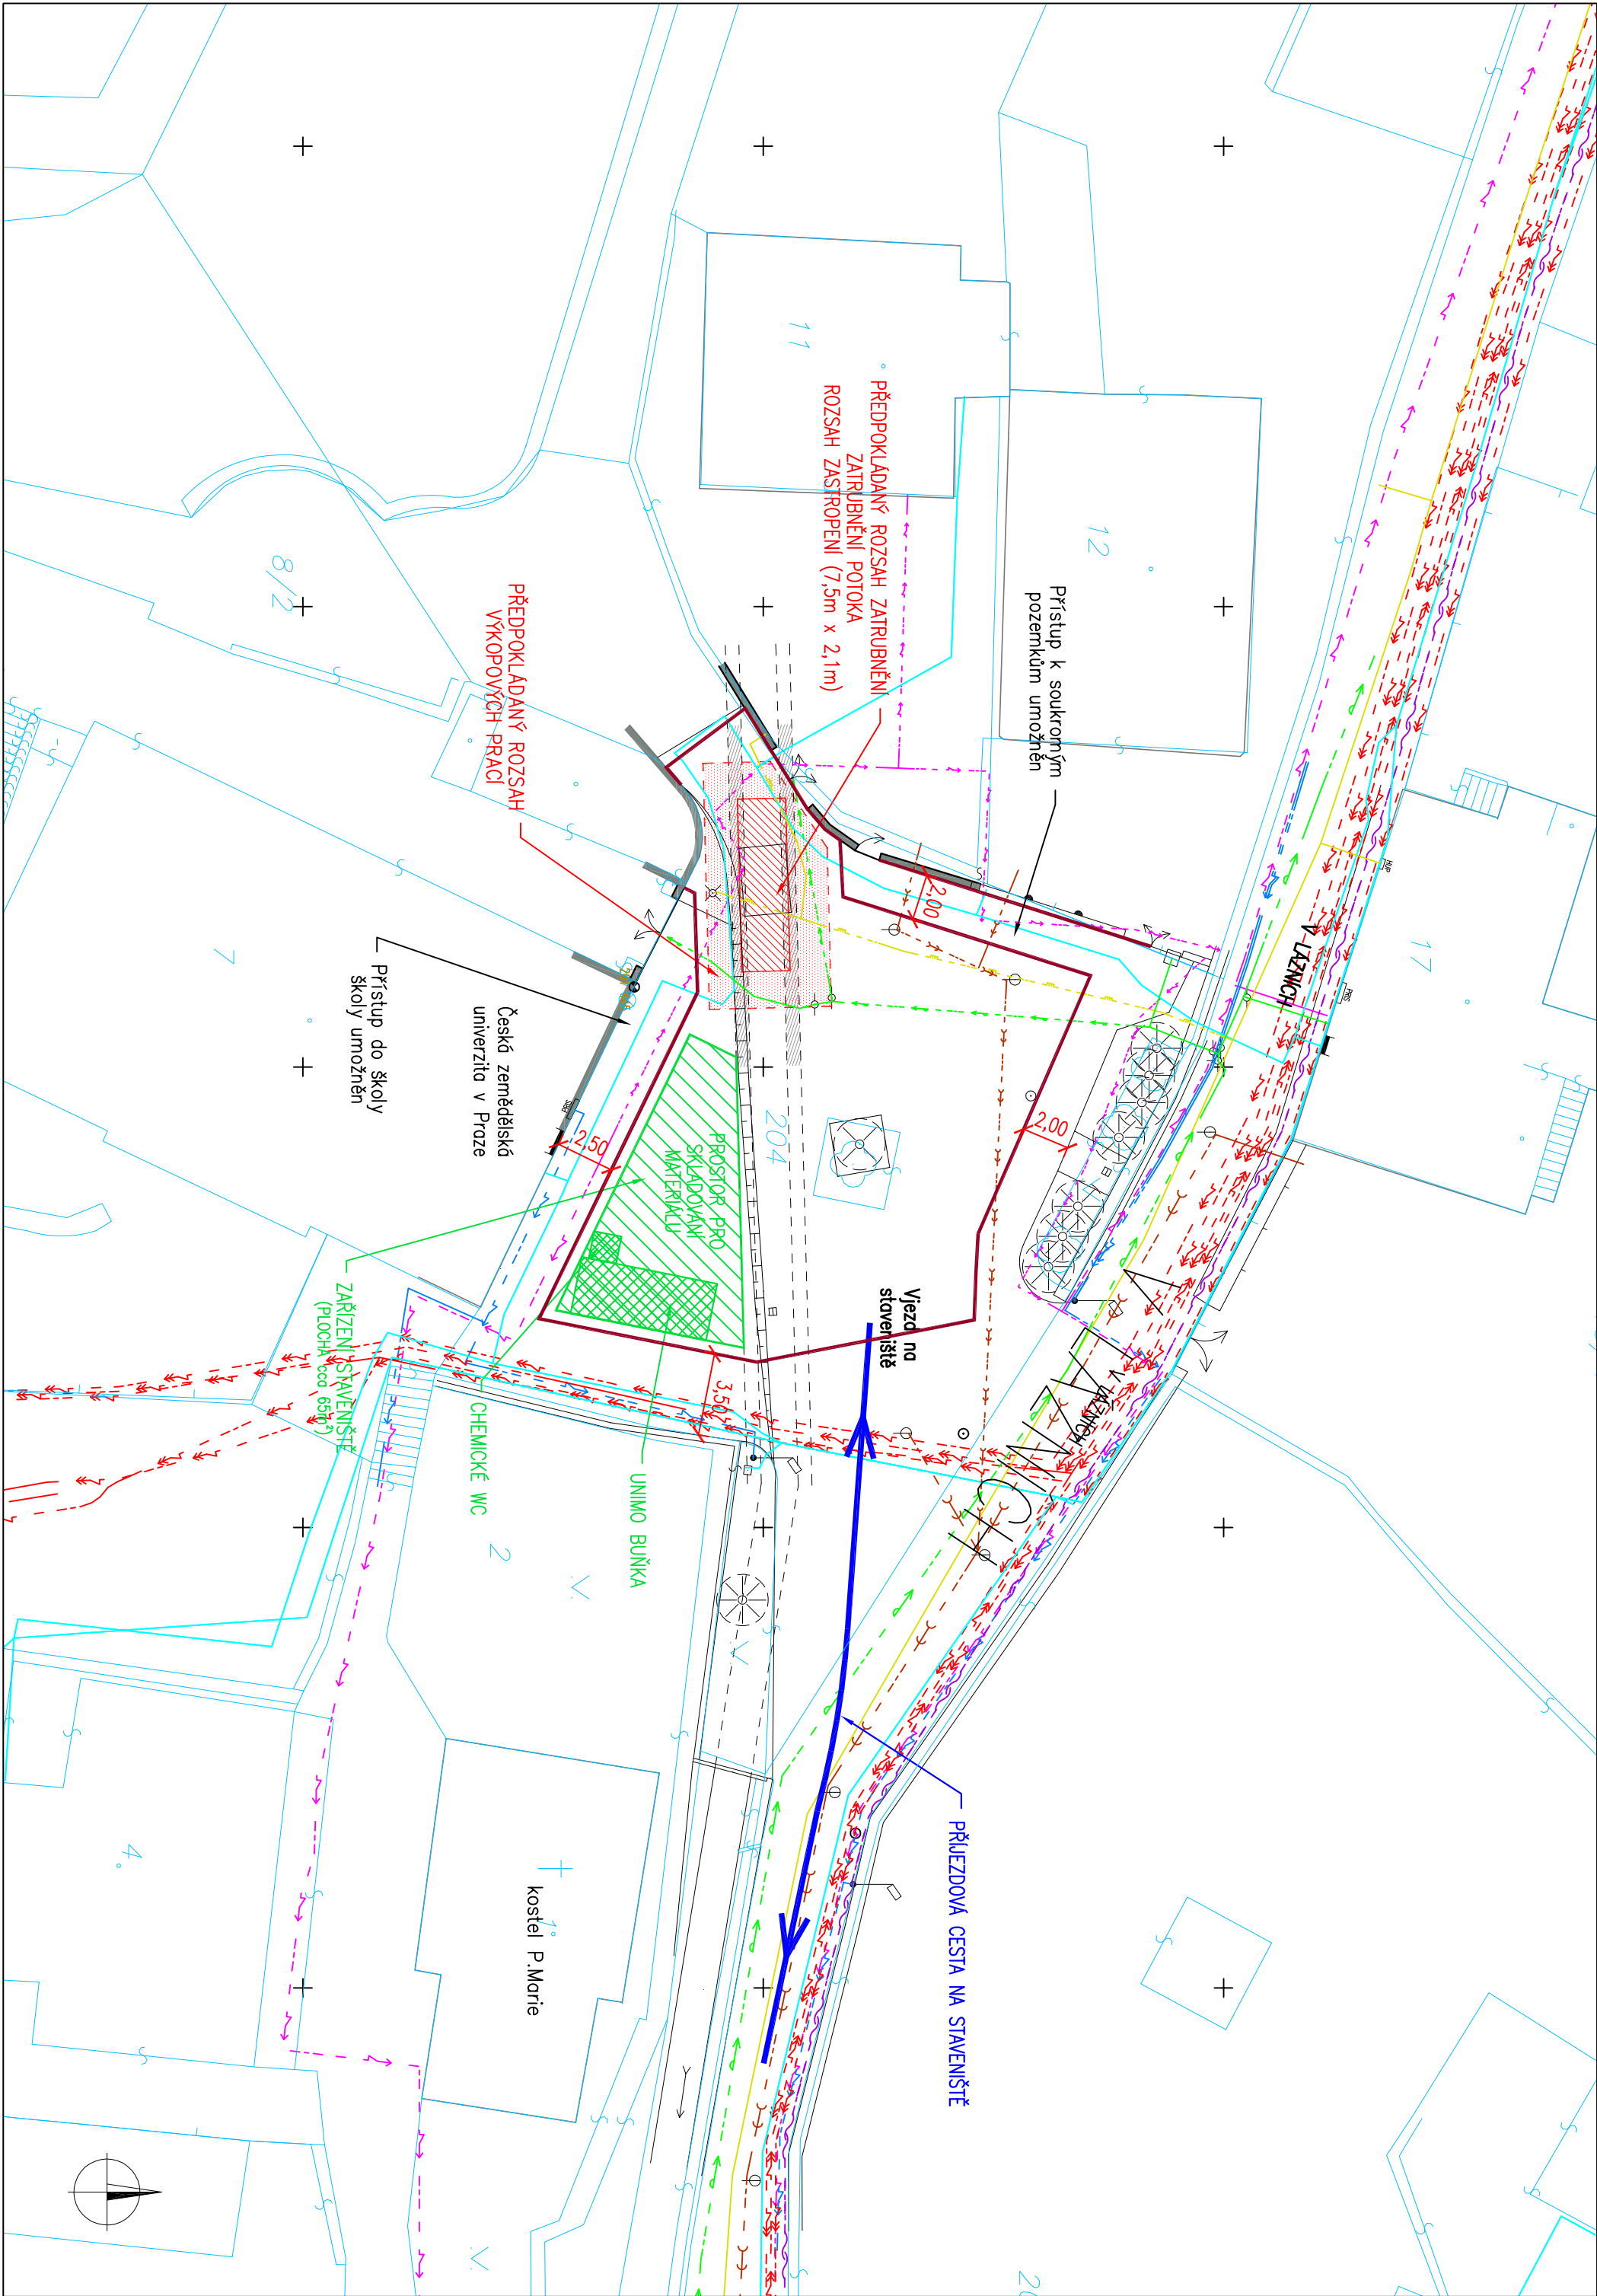

LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ NADZEMNÍ OBJEKTY
- PŘEDPOKLADANÁ PODZEMNÍ STAVAJÍCÍ STĚNA ZATŘUBNĚNÍ POTOKA
- PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH NOVÉHO ZASTROPENÍ ZATŘUBNĚNÍ POTOKA 7,5 x 2,1 m
- PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH VYKOPOVÝCH PRACÍ
- PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- DOČASNÉ OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ
- PŘÍJEZDOVÁ CESTA NA STAVENIŠTĚ

1379/24
HRANICE POZEMKŮ A PARCELNÍ ČÍSLA
DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

STAVAJÍCÍ STROMY

STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOTČENÉ STAVBOU:

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY (PVK a.s.)
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL (PRAŽSKÁ PLYNARENSKÁ DISTRIBUCE a.s.)
- EL. VEDENÍ NN – PODZEMNÍ VEDENÍ (PRE a.s.)
- SĐĚLOVACÍ VEDENÍ SPOJOVÉ (TELEFÓNICA OZ a.s.)

STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OKOLÍ STAVBY:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (PVK a.s.)
- EL. VEDENÍ VN (PRE a.s.)
- SĐĚLOVACÍ VEDENÍ SPOJOVÉ (PRE a.s.)
- EL. VEDENÍ (ELITODO – CITELUM s.r.o.)

DŮLEŽITĚ:

- VYKOPOVÉ PRÁCE NUTNO PROVADĚT RUČNĚ VZHLÉDEM K VÝSKYTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!
- ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAČÁTKEM VYKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘEDPOKLADANÉ, NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

- PŘESNÝ ROZSAH NOVÉHO ZASTROPENÍ POTOKA BUDE URČEN NA MÍSTĚ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZASTROPENÍ.

- ZAČÁTEK NOVÉHO ZASTROPENÍ BUDE URČEN NA MÍSTĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, V NÁVAZNOSTI NA MOŽNOST VYKOPU, TECHNICKÉHO PŘEVODENÍ I NA STAVAJÍCÍ ZASTROPENÍ (ZAČÁTEK OPRAVY ZASTROPENÍ CO NEJBLIŽE K OPLOČENÍ)

- PRO VÝSTAVBU BUDE POUŽÍVÁNA VODA A ENERGIE NA ZÁKLADĚ DOHODY DODAVATELE A INVESTORA, ODBĚR VODY JE MOŽNÝ Z HYDRANTŮ NA STAVENIŠTI. ENERGIE JE MOŽNĚ ČERPAT Z MOBILNÍCH ELEKTROCENTRÁL DODAVATELE.

- PŘÍJEZDOVÁ TRASA NA STAVENIŠTĚ:
- STRAKONICKÁ – ZBRASLAVSKÁ – PODJEZD – ZBRASLAVSKÁ – V LÁZNÍCH.



Rev. E		
Rev. D		
Rev. C		
Rev. B		
Rev. A		
Index:	Datum:	Změny:
Výpracoval:		

Souradnicový systém JTŠK, výškový systém Bpv

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.			Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel: +420 221 873 111, fax: +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz		
Hlavní inženýr projektu: Jan KačířEK		Zodp. projektant: Ing. Viktor NYC		Výpracoval: Ing. Miroslav ČEPA, Ing. Václav PUHÁK	
MÚ (OÚ): Praha 5		Kraj: Hl. m. Praha		Datum: 08/2012	
Investor: Technická správa komunikací hl. města Prahy		Supert:		Dokumentace pro stavební povolení	
Zakázka: "V Lázních - M.Chuchle - havárie Praha 5 - č.akce 50000/16-PD" - I.etapa		Číslo zakázky:		3217/2012	
		Měřitko:		1:250	
		Počet formátů A4:		4	
Obsah: E. Zásady organizace výstavby		Číslo přílohy:		Revize: -	
SITUACE - ZOV		E.2			
